



STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PRŮBĚH VÝSTAVBY „ČISTÁ JIZERA I“



MĚSTO TURNOV



MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č.21

Leden 2011

1. Účastníci výstavby:

<i>Projekt:</i>	Čistá Jizera I - Turnov
<i>Investor:</i>	VHS Turnov
<i>Poskytovatel podpory:</i>	SFŽP ČR
<i>Správce stavby:</i>	Ing. Pavel Krajčovič - SGS Czech Republic, s.r.o.
<i>TDI:</i>	Petr Nápravník - SGS Czech Republic, s.r.o.
<i>Dodavatel:</i>	Eurovia, a.s., OZ Čechy západ Jan Pavlíček Petr Veselý
<i>Projektant:</i>	Aquecon s.r.o., Teplice

2. **Náklady stavby:** **248 500 388,89 Kč bez DPH**
297 528 325,69 Kč vč. DPH (část 19%, část 20%)

3. **Termíny realizace:**

Předání staveniště:	16.4.2009
Zahájení stavby:	20.4.2009
Ukončení stavby:	30.9.2011

4. Hlášení o postupu prací:

4.1 **Stav fakturace po objektech za monitorované období:**
viz. Příloha 11.1

4.2 Průběh realizované činnosti po objektech:

a/ SO 01 – Rekonstrukce stoky RA – ul. Skálava, Žižkova, Alej Legií

- **Žižkova ulice, Alej Legií** : kanalizace kompletně dokončena, v ulici Žižkova jsou položeny asfalty bez obrusné vrstvy (finální vrstva bude provedena na jaře r. 2011).
- **Husova ulice** kanalizace kompletně dokončena, asfalty jsou položeny bez obrusné vrstvy po ulici Rokycanovu (finální vrstva bude provedena na jaře r. 2011).
- **Zborovská RA2**
V I.etapě byly práce na rekonstrukci kanalizace kompletně dokončeny (od Zelené cesty k vodojemům na Károvsku). V úseku I. etapy byly práce zahájeny v lednu 2011.
- **Jeronýmova RA-8**
Pokračují práce na rekonstrukci kanalizační stoky.
- **Františka Kavana RA-5**
Dokončeny práce na stoce a přípojkách.
- **Karla Vika RA-3**
Zahájeny práce na rekonstrukci stoky.

b/ SO 02- Rekonstrukce stoky RB

- **SO 02 RB 5. Května**
Práce pokračují třetí etapou, byla překročena křižovatka u nemocnice a práce pokračují směrem ke Károvsku.
- **Rokycanova RB2**
Práce na rekonstrukci kanalizační stoky dokončeny.

c/ SO 06 – dokončeno

d/ SO 07 –Koňský trh

Zhotovitel dokončil trubní část stoky. Zbývá dokončit výústní objekty – bude provedeno na jaře 2011.

e/ SO 04 –dokončeno

f/ SO 03 – Rekonstrukce stoky RC2 – ul. Na Stebni

- Zhotovitel dokončil pokládku kanalizačního potrubí v ul. ulice Na Stebni a Na Výšince, práce na stokách v ul. Hruboskalská a Valdštejská dokončeny, Nyní navazuje obj. 1.1. výstavba Na Stebni.

g/ SO 08 – Přeložky sítí

- **Žižkova ulice** - dokončeno
- **ulice 1. Máje** - dokončeno.
- **ulice Na Stebni** – dokončeno
- **Hruboskalská** – dokončeno
- **Valdštejská** – dokončeno
- **Husova ulice** – dokončeno

h / SO 1.5b – dokončeno.

ch/ SO 1.9 – dokončeno

i/ SO 1.2 – dokončeno

j/ SO 1.4 – dokončeno

k/ Tázlerova x Vejrachova RC,RC1 - dokončeno

l/ SO 1.5b Na Kamenci

Pokračují práce na stoce A 1-1. Na stoce A1 položen asfalt (obruby budou provedeny na jaře 2011), trasa A nahoru do centra, od ulice Bezejmenné bude provedena v letošním roce (kolize inženýrských sítí). Trasa v ul.Bezejmenné v úvozu přerušena z klimatických důvodů do jara.

4.3 Průměrný stav pracovníků a techniky na staveništi:

- leden 2011 : 4 THP, 25 dělníků, 12 strojníků

4.4 Kontrola harmonogramu – časové ztráty, nehody, apod.

V měsíci lednu probíhaly práce na úpravách harmonogramů v oblasti Hrušnice Károvsko a dotčených ulicích, kde jsou plánovány práce jak na rekonstrukcích a výstavbě stok a plánovaných přeložkách vodovodů, tak investic města a záměrů firem provozujících sdělovací média, plyn apod.

Zatím nejsou známy skutečnosti, které by bránily dokončení jednotlivých etap v termínech dle HMG. Dílčí harmonogramy jsou upravovány po dohodě vzhledem k potřebám VHS a MÚ.

4.5 Plnění úkolů z kontrolních dnů

Ve sledovaném měsíci došlo k aktualizaci HMG všech akcí. Tyto se průběžně vyhodnocují na kontrolních dnech a pracovních poradách stavby. Viz bod 4.4.

5. Projednání ostatních skutečností

Stoka F : Proběhly jednání ohledně odvedení balastních vod z dotčené oblasti. Projektant upravil projektovou dokumentaci.

K.Vika : Zahájení prací na stoce bylo oznámeno dotčeným obyvatelům.

Lokalita 1.3 Hruštica Károvsko : Probíhají jednání o koordinaci s dodavateli ostatních investic.

6. Organizační záležitosti

V daném období nedošlo k žádným organizačním změnám.

6.1 Přehled uskutečněných kontrolních dní:

KDS č. 30 20.1.2011

6.2 Harmonogram kontrolních dní pro další sledované období:

KDS č. 31 10.2.2011

6.3 Změny v organizační struktuře:

Ve sledovaném období nedošlo ke změně v organizační struktuře.

7. Způsob propagace, zdroje financování:

Tiskové zprávy – při podpisech smluv o dílo, při slavnostních zahájeních, průběžné dle potřeby 2-3x měsíčně. Komunikace a konzultace s médii na místní, regionální, krajské a celostátní úrovni – letáky a billboardy – webové stránky města Turnovu – propojené odkazy na Čistou Jizeru a VHS Turnov. Webové stránky VHS Turnov s odkazy na webové stránky měst.

8. Specifické problémy stavby:

Jednání s vlastníky pozemků, jenž mají návaznost na projekt Čistá Jizera, jsou řešeny individuálně a operativně.

9. Měsíční prostavěnost k 31.1.2011:

6.983.678,36 Kč bez DPH

8.380.414,03 Kč vč. DPH

10. Změny vůči P

K fakturaci byl vystaven za měsíc leden jeden změnový list č. 5 (viz fakturace a ZL5)

11. Přílohy:

11.1 Příloha 11.1 – Stav fakturace Turnov – leden 2011

11.2 Příloha 11.2 – Graf plnění finančního plánu – leden 2011

11.3 Příloha 11.3 – Fotodokumentace stavby – výběr

Vypracoval: Petr Nápravník - TDI Turnov – 31.1.2011


Finalizace: Ing.Pavel Krajčovič – Správce stavby

Příloha 11.1 Stav fakturace k 31.1.2011 TURNOV

Označení dle SoD	Ozn.objektu dle SFŽP definice objektů	Objekt	Celková cena bez DPH / Kč /	Za období dle SoD	Od počátku celkem	%	Zůstatek
		Stavební objekty celkem	240 150 388,89	4 574 992,94	193 566 634,22	80,6%	46 583 754,67
Dostavby:		ČJ I - 1.1 Výstavba:	93 426 598,70	392 129,50	69 583 592,05	74,5%	23 843 006,65
1.5b	Durychov	ČJ I - 1.1.01 Dostavba Durychov	6 092 559,49	-	6 092 559,27	100,0%	0,22
1.3b	Hrušnice-Károvsko	ČJ I - 1.1.02 Hrušnice - Károvsko	14 074 689,90	392 129,50	2 138 269,34	15,2%	11 936 420,56
1.3a	Hruš.-Kár. - stoka F	ČJ I - 1.1.03 Hrušnice - stoka F	2 244 818,11	-	850 238,85	37,9%	1 394 579,26
1.9	Kobylka Bukovina Dolánky	ČJ I - 1.1.04 KO - BU - DO_ČS 2, 3, 6	4 450 425,39	-	4 450 425,39	100,0%	-
		ČJ I - 1.1.05 KO - BU - DO_výtlač V2,V3,V6	1 875 095,80	-	1 875 095,80	100,0%	-
		ČJ I - 1.1.06 KO - BU - DO_řad B,vč.přípojek	12 571 726,41	-	12 571 726,39	100,0%	0,02
		ČJ I - 1.1.07 KO - BU - DO_řad C,vč.přípojek	9 525 779,92	-	9 525 779,94	100,0%	- 0,02
		ČJ I - 1.1.08 KO - BU - DO_řad D,vč.přípojek	5 265 333,44	-	5 265 333,45	100,0%	- 0,01
		ČJ I - 1.1.09 KO - BU - DO_řad E,vč.přípojek	2 764 014,13	-	2 764 014,13	100,0%	-
1.5a	Na Kamenci	ČJ I - 1.1.10 Na Kamenci	10 049 236,98	-	7 000 369,24	69,7%	3 048 867,74
1.1	Na Stebni	ČJ I - 1.1.11 Na Stebni	7 824 120,02	-	360 981,11	4,6%	7 463 138,91
1.2	Nudvojovice	ČJ I - 1.1.12 Nudvojovice	13 835 958,37	-	13 835 958,40	100,0%	- 0,03
1.4	Palackého	ČJ I - 1.1.13 Palackého	2 852 840,74	-	2 852 840,74	100,0%	-
Rekonstrukce		ČJ I - 1.2 Rekonstrukce:	130 697 552,10	3 365 024,62	112 300 634,26	85,9%	18 396 917,84
SO 01	Řady A,L	ČJ I - 1.2.01 SO 01 - RP - řady A 1-8	19 998 173,07	1 437 525,08	10 937 083,76	54,7%	9 061 089,31
		ČJ I - 1.2.02 SO 01 - RP - řady A	19 014 030,47	-	18 974 723,87	99,8%	39 306,60
		ČJ I - 1.2.03 SO 01 - RP - řady L	3 494 287,61	-	323 014,60	9,2%	3 171 273,01
SO 02	Řady B	ČJ I - 1.2.04 SO 02 - RP - řady B	13 458 976,68	1 121 948,00	11 565 425,51	85,9%	1 893 551,17
SO 03	Řady C	ČJ I - 1.2.05 SO 03 - RP - řady C	10 704 221,53	-	9 607 046,43	89,8%	1 097 175,10
SO 04	Řady Z,F	ČJ I - 1.2.06 SO 04 - RP - řady Z, F	3 061 629,36	-	3 061 629,36	100,0%	-
SO 06	Řady D,E,G	ČJ I - 1.2.07 SO 06 - RP - řady D, E, G	4 941 926,20	-	4 528 918,20	91,6%	413 008,00
SO 07	Řady T,OK,KS	ČJ I - 1.2.08 SO 07 - RP - řady T	1 789 581,46	-	1 789 581,19	100,0%	0,27
		ČJ I - 1.2.09 SO 07 - RP - řady OK	13 824 938,31	-	13 674 874,17	98,9%	150 064,14
		ČJ I - 1.2.10 SO 07 - RP - řady KS	11 639 235,03	-	11 639 235,34	100,0%	- 0,31
SO 08	Přeložky IS	ČJ I - 1.2.11 SO 08 - RP - Přeložky v 1-4	7 495 953,28	-	7 495 952,80	100,0%	0,48
		ČJ I - 1.2.12 SO 08 - RP - Přeložky v 5-6	19 044 306,60	805 551,54	16 472 856,53	86,5%	2 571 450,07
		ČJ I - 1.2.13 SO 08 - RP - Přeložky IS	2 230 292,50	-	2 230 292,50	100,0%	-
REK - kan. přípojky		ČJ I - 1.3 Rekonstrukce - přípojky:	16 026 238,09	817 838,82	11 682 407,91	72,9%	4 343 830,18
	Přípojky k SO 01	ČJ I - 1.3.01 SO 01 - RP - řady A, L	7 889 428,66	568 267,42	4 417 209,78	56,0%	3 472 218,88
	Přípojky k SO 02	ČJ I - 1.3.02 SO 02 - RP - řady B	3 041 528,21	249 571,40	2 257 405,66	74,2%	784 122,55
	Přípojky k SO 03	ČJ I - 1.3.03 SO 03 - RP - řady C	2 380 194,68	-	2 380 194,69	100,0%	- 0,01
	Přípojky k SO 04	ČJ I - 1.3.04 SO 04 - RP - řady Z, F	720 776,92	-	720 776,92	100,0%	-
	Přípojky k SO 06	ČJ I - 1.3.05 SO 06 - RP - řady D, E, G	1 994 309,62	-	1 906 820,86	95,6%	87 488,76
		ČJ I - 1.4 Inženýrská kompletační činnost - IKČ	2 350 000,00	2 408 685,42	2 259 331,00	96,1%	90 669,00
		ČJ I - 1.5 Rezerva	6 000 000,00	-	3 601 314,58	60,0%	2 398 685,42
		Celkem	248 500 388,89	6 983 678,36	199 427 279,80	80,3%	49 073 109,09
		Základ DPH 19%	67 214 097,57	-	-	-	-
		Celkem cena s DPH 19%	79 984 776,11	-	-	-	-
		Základ DPH 20%	181 286 291,32	6 983 678,36	-	-	-
		Celkem cena s DPH 20%	217 543 549,58	8 380 414,03	-	-	-
		Celkem celkem s DPH	297 528 325,69	8 380 414,03	-	-	-

01/11		02/11		03/11		04/11		05/11		06/11		07/11		08/11		09/11	
HMG	Skut.	HMG	Skut.	HMG	Skut.	HMG	Skut.	HMG	Skut.	HMG	Skut.	HMG	Skut.	HMG	Skut.	HMG	Skut.
0,95	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM		
HMG	Skut.	plnění
0,95	6,98	734,7%

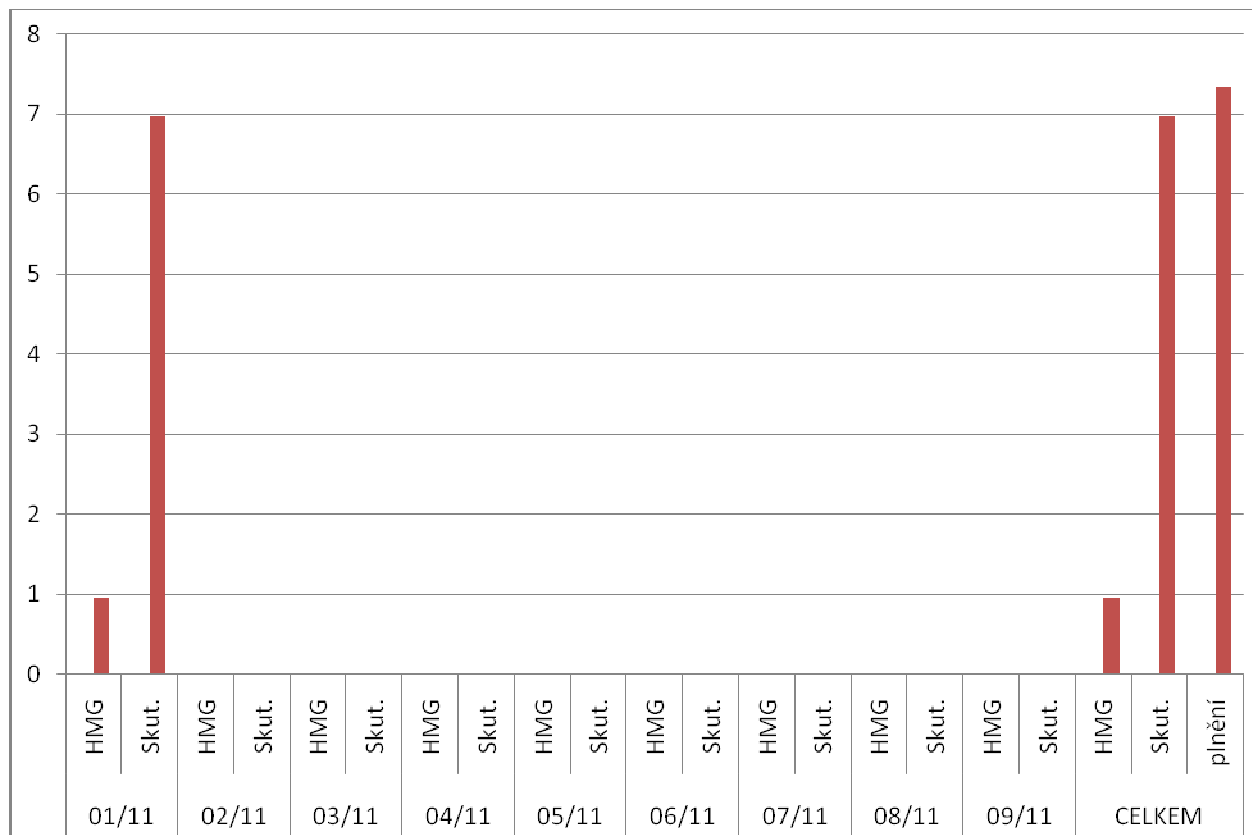

Jeronýmova ulice

Vodovod



Celkový pohled v ulici na výkop



Příprava na kanalizační přípojky a uliční vpusti



Zásyp



5.května

Výkop v křižovatce u nemocnice



Dopravní situace u nemocnice



Výkop za křižovatkou – směr Hrušnice



Výkop nad křižovatkou – směr Turnov



Rokycanova ulice

Pažení a zásyp ve výkopu



Přechod nad výkopem



Situace ve výkopu




Budoucí Revizní šachta a uliční vpust' proti garážovému vjezdu



ulice F.Kavana

Celkový pohled v ulici

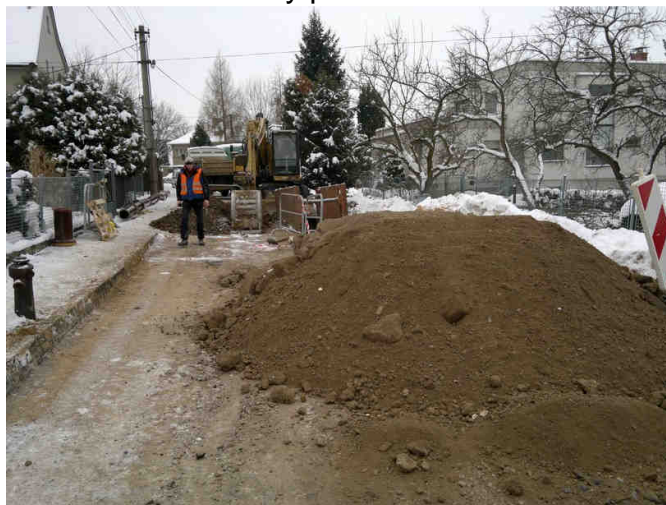

Výkop u Š 139x



Pažení výkopu



Zborovská ulice

Pohled v křižovatce s Žižkovou ul. u bytovek



Výkopové práce detail



Detail výkopu



Výkop u Š 16x



Ulice K.Víka

Pohled do ulice



Zahájení výkopu v Karla Vika u Lidické ulice



Příprava pažení ve výkopu



Detail výkopu v ul. Karla Vika

